

Bautagebuch – Anbau eines Umkleideraumes an das Feuerwehrhaus am Froschweg

- 13.11.2011 Gespräch zwischen Martin Preuß CSU und Wolfgang Weigl anlässlich des Volkstrauertages über einen möglichen Anbau
- 08.12.2011 Vermessungsarbeiten am Feuerwehrhaus
- 30.04.2012 Offizieller Brief an Oberbürgermeister Wolfgang Dandorfer, mit der Bitte um Bewilligung der Geldmittel für den geplanten Anbau
- 22.08.2012 Vorstellung des Projektes bei der CSU-Stadtratsfraktion vor Ort im Gerätehaus mit Bürgermeister Michael Cerny, Fraktionsvorsitzenden Dieter Mußemann, Stadträten Gabi Donhäuser, Martin Preuß, Stefan Ott, Thomas Bärtlein



- 19.11.2012 Genehmigung der Haushaltsmittel 2013 und die darin enthaltenen Mittel für den Anbau an das Feuerwehrhaus in Ammersricht
- 24.11.2012 Untersuchung des Baugrundes und der vorhandenen Fundamente des bestehenden Gebäudes mit Bauunternehmer Hr. Bernhard Nagler und Statiker Hr. Walter Trösch
- 28.11.2012 Gründung eines Bauausschusses mit Wolfgang Weigl, Wolfgang Nagler, Reinhard Birner, Sebastian Danzer, Christian Schafbauer, Bernhard Dotzler, Konrad Nagler
- 05.12.2012 Abstimmungsgespräch mit dem Hochbauamt der Stadt Amberg, Hr. Hans-Georg Wiegel und Hr. Franz Eckl
- 07.01.2013 Fertigstellung der Baupläne und der Baumappe durch Wolfgang Weigl
- [Grundriss Erdgeschoss](#), [Außenansicht](#)
- 09.01.2013 Freigabe des Kriterienkataloges durch Statiker
- 14.01.2013 Unterschriften des Bauherrn Oberbürgermeister Wolfgang Dandorfer auf den Bauplänen und der Bauplanmappe
- 21.01.2013 Fertigstellung der Baustatik
- 08.02.2013 Roden der Bäume und Sträucher an der künftigen Baustelle



02.03.2013 Vorbereiten der Stromverteilung für Baustrom und Versorgung des Anbaus



04.03.2013 Genehmigung der Baupläne durch das Referat für Stadtentwicklung u. Bauen, ohne Auflagen

08.03.2013 Baubeginnsanzeige

08.03.2013 Einrichten der Baustelle und abtragen des Humus, freilegen der vorhandenen Gasleitung



09.03.2013 Erdarbeiten für die neue Gasleitung





11.03.2013 Alte Gasleitung ausbauen, neue Erdgasleitung verlegen mit Stadtwerke und Fa. Wünschmann. Graben verfüllen.



12.03.2013 Freilegen der Fundamente



14.03.2013 Freilegen und unterfangen der Fundamente, Grundanstrich am bestehenden Gebäude angebracht



15.03.2013 Freilegen und unterfangen der Fundamente



- 16.03.2013 Ausschalen der Fundamente
- 18.03.2013 Freilegen und unterfangen der Fundamente
- 19.03.2013 Freilegen und unterfangen der Fundamente
- 20.03.2013 1. Spatenstich, ausheben der Baugrube



- 21.03.2013 Ausheben der Baugrube, einbringen der Sauberkeitsschicht
- 22.03.2013 Einschalen der Bodenplatte, einbringen der Armierungseisen, aufbau des Baukrans



- 23.03.2013 Einbringen der Armierungseisen
- 27.03.2013 Bodenplatte betonieren, Oberfläche flügelglätten



28.03.2013 Einschalen der Kellerwände
30.03.2013 Einschalen der Kellerwände



- 02.04.2013 Betonieren der Kellerwände
- 03.04.2013 Aus-Einschalen der Kellerwände
- 04.04.2013 Betonieren der Kellerwände
- 05.04.2013 Ausschalen der Kellerwände



06.04.2013 Grundanstrich angebracht, Wände isoliert und Baugrube verfüllt



10.04.2013 Aufstellen der Baustützen



11.04.2013 Verlegen der Fertigdecke, einschalen der Kellerdecke und einbringen der Armierungseisen



12.04.2013 Betonieren der Kellerdecke
13.04.2013 Ausschalen der Kellerdecke
15.04.2013 Mauern der Außenwände



- 16.04.2013 Mauern der Außenwände
- 17.04.2013 Betonieren der Ringankers, ausbau und ausmauern der alten Fenster in der Fahrzeughalle
- 18.04.2013 Ausbau und ausmauern der alten Fenster in der Fahrzeughalle
- 22.04.2013 Abbau des Baukrans



- 27.04.2013 Vorbereitungen für die Elektroinstallation, trockenlegen des Kellers
- 04.05.2013 Abbinden und aufstellen des Dachstuhls



- 06.05.2013 Aufmauern der Giebelwände
- 10.05.2013 Fertigstellen des Dachstuhls, Vorbereitungen für den Durchbruch
- 11.05.2013 Montieren der Lattung am Dachstuhl, Richtfest



- 13.01.2013 Montage der Türen und Fenster, Durchbruch durch die Fahrzeughalle, Isolieren des Dachs
- 17.05.2013 Anbringen der Dachrinne und des Blechdachs
- 18.05.2013 Montieren des Blechdachs
- 21.05.2013 Montage der Heizung
- 22.05.2013 Montage der Heizung
- 31.05.2013 Malerarbeiten im Keller
- 01.06.2013 Malerarbeiten im Keller
- 03.-10.06.2013 Laibungen verputzt, Eckleisten angebracht
- 10.06.2013 Außenisolierung befestigen
- 11.06.2013 Heizungsrohre isolieren
- 13.06.2013 Heizungsrohre isolieren
- 14.06.2013 Innenwände verputzt
- 19.06.2013 Vorbereitung für Außenputz
- 21.06.2013 Abgehängte Decke angebracht
- 22.06.2013 Abgehängte Decke angebracht




- 28.06.2013 1. Lage Außenputz
- 29.06.2013 Leichtbauwände zum Treppenaus aufgestellt



- 03.07.2013 Fertigstellung der Leichtbauwände
- 05.07.2013 Spachteln der Decke
- 06.07.2013 Spachteln und schleifen den Decke
- 12.07.2013 2. Lage Außenputz



13.07.2013 Streichen der Innenwände
17.07.2013 Montage der Kellertreppe

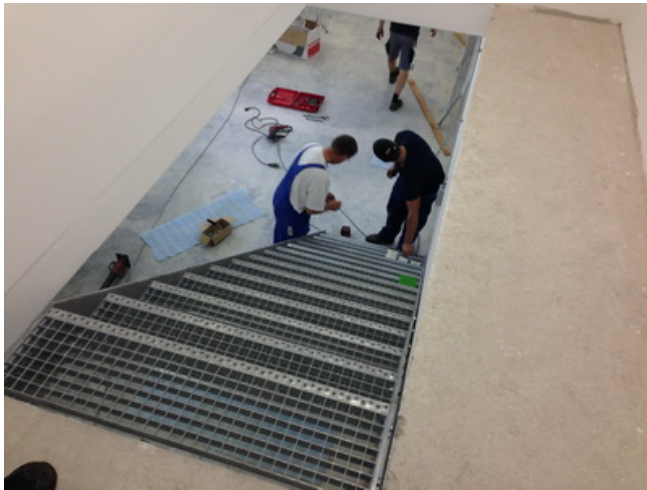

19.07.2013 Streichen der Decke
20.07.2013 Streichen der Decke, Fußboden für die Fliesen vorbereitet
22.-25.07.2013 Legen der Fliesen



27.07.2013 Montage der Abflussrinnen

02.08.2013 Reinigung der Spinde, einräumen der neuen Umkleide, Reinigung der Decke in der Fahrzeughalle



- 03.08.2013 Reinigung der Fahrzeughalle
- 27.09.2013 3. Lage Außenputz
- 28.09.2013 Kratzen des Edelputzes, abbau des Gerüsts
- 04.10.2013 Fertig auffüllen der ehemaligen Baugrube, verteilen des Humus
- 05.10.2013 Verteilen des Humus
- 24.10.2013 Ansäen der Rasenflächen

Zwischen den einzelnen Eckterminen tagte der Bauausschuss, wurden Angebote eingeholt, Bestellungen getätigt und viele Details abgeklärt
